

CRONOGRAMA DE OBRA CIVIL - TARSO ENGENHARIA

EMPRESA CONTRATANTE: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA LAR MARIA CLARA (ILPI).

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS: Compreende execução de fundação, super-estrutura, alvenaria, laje estrutural, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral.

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua: Joaquim Camargos, N 362, Bairro Centro, Contagem M.G.

ETAPA 01: 06 quartos, 06 banheiros e parte de corredor de acesso.

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES: 21/10/2019 à 21/01/2020.

SERVIÇOS	INÍCIO	TÉRMINO	DIAS
Fundação	21/10/2019	01/11/2019	10
Super-Estrutura	28/10/2019	08/11/2019	10
Alvenaria	11/11/2019	22/11/2019	09
Laje Estrutural	25/11/2019	13/12/2019	15
Hidráulica	21/10/2019	29/11/2019	29
Elétrica	25/11/2019	13/12/2019	15
Esquadrias (Portas/Janelas)	02/01/2020	21/01/2020	14
Acessibilidade	02/01/2020	21/01/2020	14
Telecomunicações	28/10/2019	29/11/2019	24
Predisposição de Combate a Incêndio	28/10/2019	10/01/2020	47
Acabamentos (revestimentos, elétr/telec, hidráulica)	09/12/2019	21/01/2020	30
DURAÇÃO TOTAL – DIAS ÚTEIS (EXCETO FERIADOS: 15/11/2019, 25/12/2019, 01/01/2020)			64

Data: 21/10/2019

Elaborado por: Marcos Souza Filho

Conferido por: Igor Belchior de Andrade Fernandes

Aprovado por: Saulo de Tarso Souza

CREA (EMPRESA): 075782


CRONOGRAMA EXECUTIVO PRELIMINAR

OBRA: LAR MARIA CLARA

PROJETO: GIRASSOL 02

EMPRESA: T7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LAYOUT DA OBRA

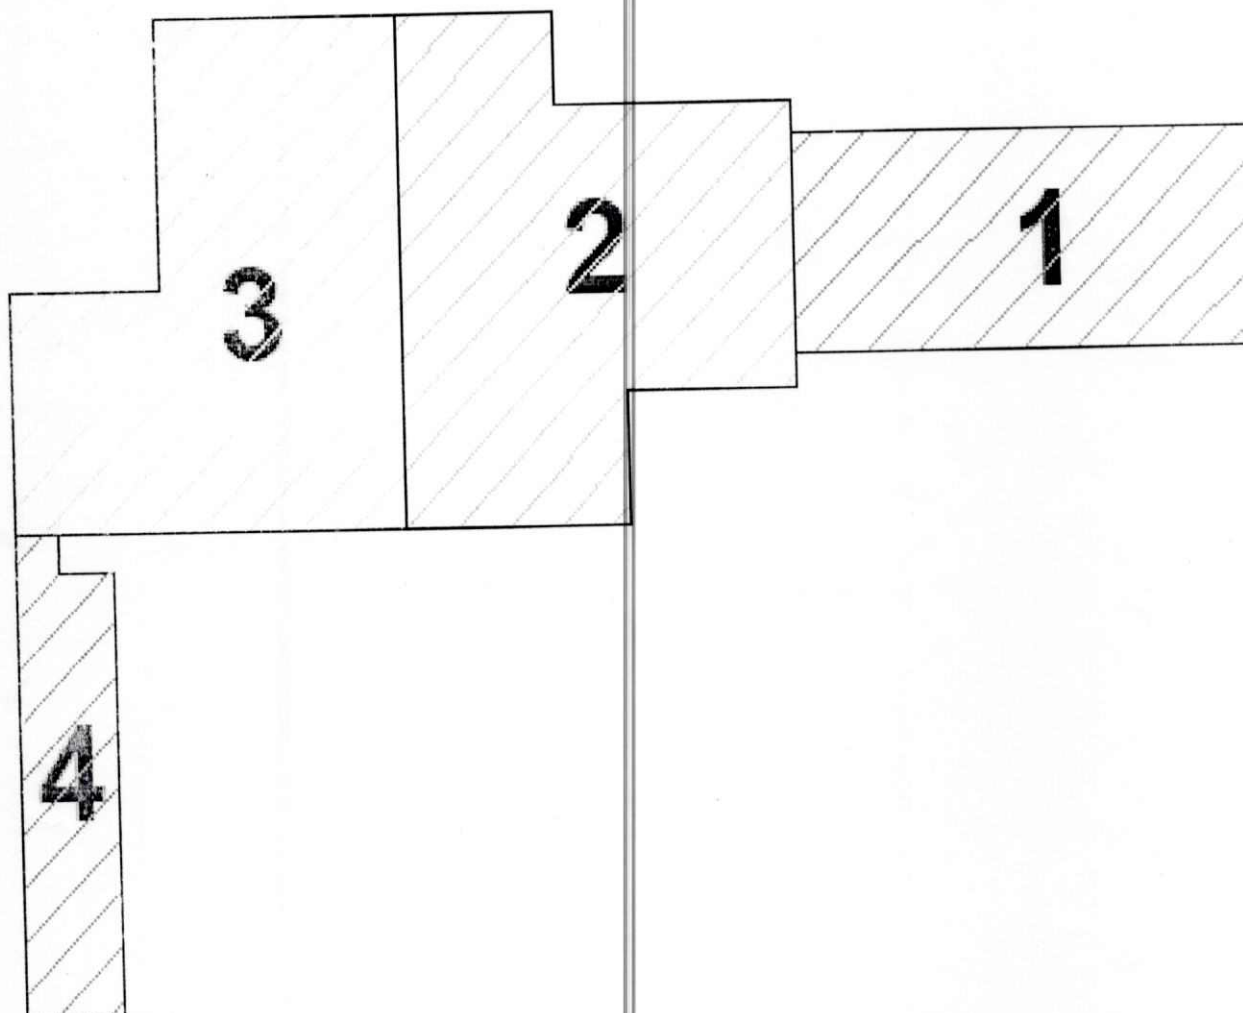

ETAPA 01

- 1.1 Compreende execução de 06 quartos, 06 banheiros e parte de corredor de acesso;
- 1.2 Inclusos: Super-estrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, pintura, acessibilidade, esquadrias, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio e acabamentos em geral.

ETAPA 02

- 2.1 Compreende execução de 08 quartos, 08 banheiros, 01 posto de enfermagem e parte dos corredores de acesso;
- 2.2 Inclusos: Serviços preliminares, fundação, super-estrutura, alvenaria, hidráulica, elétrica, acessibilidade, telecomunicações, predisposição de combate a incêndio.

ETAPA 03

- 3.1 Cronograma de execução a definir.

ETAPA 04

- 4.1 Cronograma de execução a definir.

CRONOGRAMA PRELIMINAR

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS EXECUTIVO
1	21/10/2019	21/01/2020	100%


ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS EXECUTIVO
2	22/01/2020	22/03/2020	60%

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS EXECUTIVO
3	-----	-----	N/A

ETAPA	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS EXECUTIVO
4	-----	-----	N/A

OBS.: PRAZO FINAL DOS SERVIÇOS: 5 MESES CORRIDOS.

Belo Horizonte M.G, 21/10/2019


 T7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI


 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS
