



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

Doc - 4499
06/12/18

12.652

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.045/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ.

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM** com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado a **CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.102.452.0001-47 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL GLÓRIA MARQUES DINIZ** situada à Rua Goiabão, nº 50, Bairro Bom Jesus, em Contagem/MG, CEP. 32.185-310, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente **Sirlene Mônica de Moura**, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG na Rua Alba, nº 94, Bairro Nossa Senhora da Glória, CEP 30870-080, portadora do CPF nº 620.239.266-53 e RG MG3.231.389 PC/MG, acordam firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso 045, no valor de **R\$ 19.999,98** (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário do Termo de Compromisso ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 121.379,31 (Cento e vinte e um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: OF;010 / 2018 e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1 **REPASSE:** O recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 10**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2 **EXECUÇÃO:** A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 11**) do Plano de Trabalho anexo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta da seguinte dotação orçamentária:

1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 12**) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente termo de Compromisso terá vigência até a data de **31/01/2019**.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 04 de Dezembro de 2018.


SUELI MÁRIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


SIRLENE MÔNICA DE MOURA
Caixa Escolar Glória Marques Diniz




1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA:		CAIXA ESCOLAR GLORIA MARQUES DINIZ	
CNPJ:	01.102.452/0001-47	LEI Nº	4203/2008
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	RUA GOIABAO	Nº:	50 CEP: 32185310
Bairro:	BAIRRO BOM JESUS	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	emgloriamarquesdiniz@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	Brasil / 001	Nº conta corrente:	56970-4 Agência/nº: Ceasa 1804-X
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	SIRLENE MÔNICA DE MOURA		
CPF:	620.239.266-53	CI/Órgão Expedidor:	MG 3.231.389 PC/MG
Cargo/Função:	Diretor	Período de Mandato:	2016-2018
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	RUA ALBA	Nº:	94 CEP: 30870-080
Bairro:	NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Cidade:	BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:			
02 - OUTROS PARTICÍPES			
ENTIDADE INTERVENIENTE:			
Endereço:			
Órgão/ concedente:	Secretaria Municipal de Educação		
Nome do Responsável:	Sueli Maria Baliza Dias		
03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA			
TÍTULO:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		
PERÍODO DE EXECUÇÃO			
Início:	Novembro de 2018	Término:	31/01/2019
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO			
Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ.			
JUSTIFICATIVA			
Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.			



Handwritten signatures and initials in blue ink.

04 - PÚBLICO ALVO		
Alunos da rede municipal de ensino fundamental e infantil matriculados na unidade escolar constante na item 1 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	1114	
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino fundamental e da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Novembro/2018 a Janeiro/2019
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2018 a Janeiro/2019
3	Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/2018 a Janeiro/2019
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO		DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de material de informática, aquisição de material bibliográficos.	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com reparos e outras providências de manutenção e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reformas/reparo (desde que autorizadas pela SEDUC).	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Recursos Vinculados - Ensino Fundamental 1.12.1.12.365.0029.2080- 335041 Fonte: 0101		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO INFANTIL / Parcela Única - Adaptações na escola para atendimento à Educação Infantil.	R\$ 19.999,98	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 19.999,98	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO INFANTIL / Parcela Única - Adaptações na escola para atendimento à Educação Infantil.	R\$ 19.999,98	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 19.999,98	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de Recurso	Descrição	Prazo
CUSTEIO INFANTIL / Parcela Única - Adaptações na escola para atendimento à Educação Infantil.	R\$ 19.999,98	Até 28/02/2019

10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.


Contagem, 04 de dezembro de 2018


SIRLENE MÔNICA DE MOURA
Caixa Escolar Glória Marques Diniz

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.


Contagem, de de 2018


Superintendência de Educação Básica


Diretoria de Orçamento e Finanças

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração Termo de Compromisso.

Contagem, de de 2018


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação





ESCOLA MUNICIPAL "GLÓRIA MARQUES DINIZ"

Contagem, 14 de novembro de 2018.

OF. 181.2018

À SEDUC/GABINETE


SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERAÇÕES

SÉRGIO MENDES

E.M. "GLÓRIA MARQUES DINIZ"
1º AO 9º ANO / EDUCAÇÃO INFANTIL
Lei de Criação 2421/92
Portaria de Aut. 600/95
Rua Goiábão, 50 - Bom Jesus
32.185-310 - Contagem - MG
Tel.: 3352-5189

Solicito a liberação do aditivo referente a reforma da casinha de boneca, o refazer do contrapiso ao redor das árvores do pátio da Educação Infantil e o assentamento das grades de divisa e portão. Conforme reunião e visita *in loquo* ocorridas em agosto de 2018.

Agradecemos a sua presteza e atenção.



SIRLENE MÔNICA DE MOURA

DIRETORA ESCOLAR

Sirlene Mônica de Moura
DIRIGENTE ESCOLAR
Matrícula: 36.072-4
E.M. GLÓRIA MARQUES DINIZ






PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Glória Marques


(Reforma das casinhas de boneca)



1. Vista da casinha 1 .

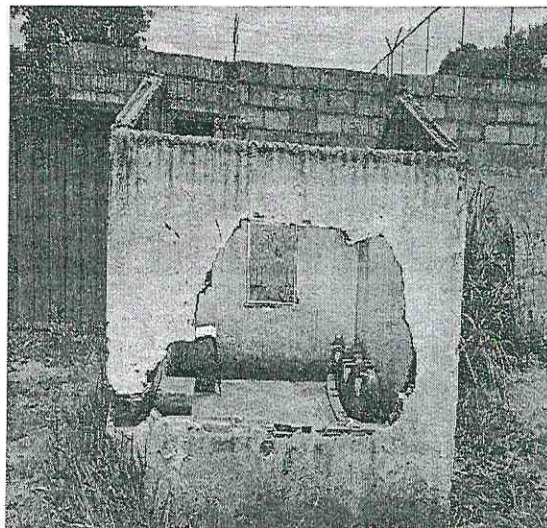

2. Vista da cainha 1 – lateral direita.

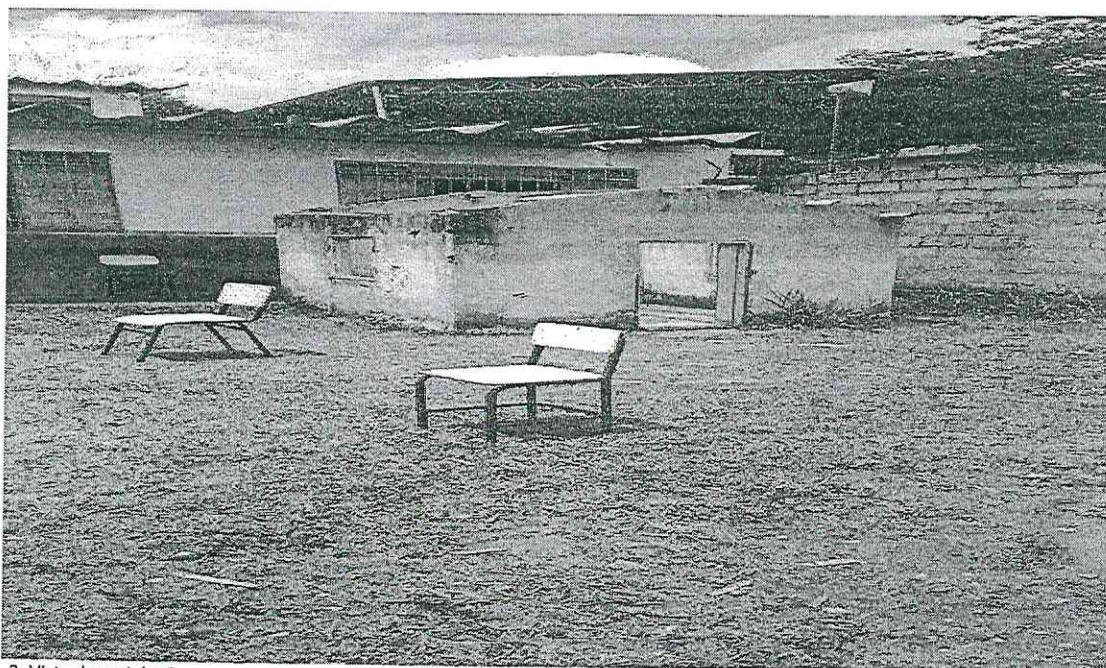

3. Vista da casinha 2







PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Glória Marques


(Assentamento de grade de divisa e portão)

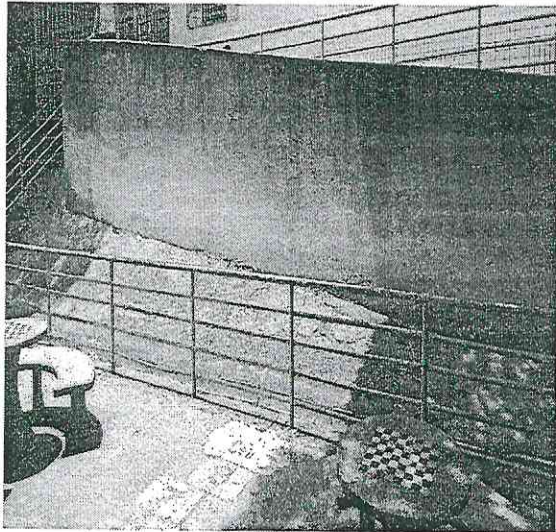

1. Vista lateral (direita) área de instalação de grade – divisa.

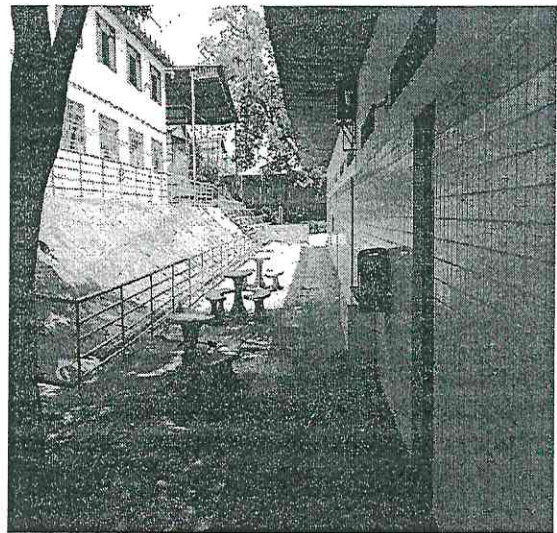

2. Vista frontal da área de instalação de grade e portão.

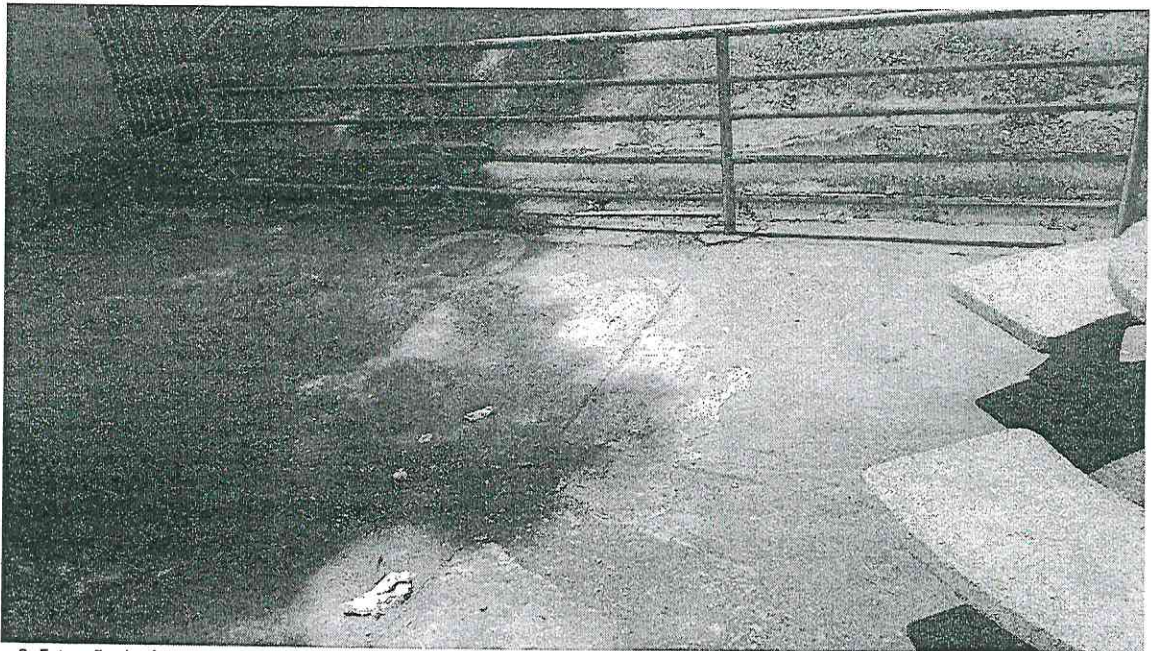

3. Extensão da área externa – pátio da Educação Infantil





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM


Relatório Fotográfico

E.M. Glória Marques

(reforma do piso próximo às árvores - contra-piso)




1. Vista do piso em concreto danificado.

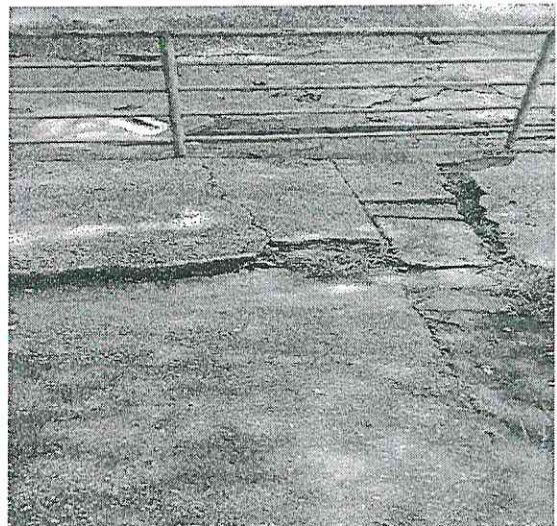

2. Vista do piso a ser reformado (pátio da Ed. Infantil)



3. Vista do piso em concreto danificado.

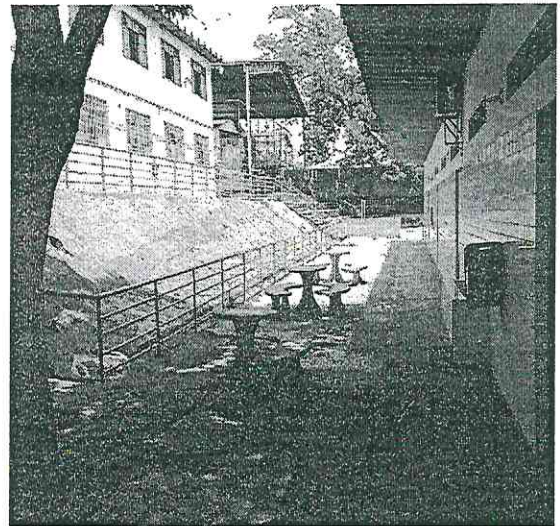

4. Vista da área (lado direito).



E. M. GLÓRIA MARQUES
Rua do Goiabão, 50 - Bom Jesus, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Refazer contrapiso danificado ao redor da árvore no pátio da educação infantil, assentamento da grade de divisa e portão, reutilizando grades existentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.143,16	R\$ 21,43
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	30,4	R\$ 13,71	R\$ 416,86
03	GRADES E PORTÕES				
03.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS GRADES E CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES UTILIZANDO AS GRADES EXISTENTES	vb	1,0	R\$ 800,00	R\$ 800,00
04	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
04.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	30,4	R\$ 28,25	R\$ 858,80
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 2,25	R\$ 67,50

SUB-TOTAL: R\$ 2.164,59

OBJETO DO ORÇAMENTO: Contra piso frontal a sala multimídia e mão de obra para assentamento do piso intertravado que será recebido da doação da UMEI Bernardo Monteiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 8.600,95	R\$ 86,01
				SUB-TOTAL ITEM 01:	R\$ 86,01
03	CONTRAPISO DESEMPENADO FRONTAL A SALA MULTIMÍDIA				
03.01	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	m²	159,9	R\$ 7,53	R\$ 1.202,87
03.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	159,9	R\$ 28,25	R\$ 4.515,76
				SUB-TOTAL ITEM 03:	R\$ 5.718,63
04	SERVIÇOS AUXILIARES				
04.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	m²	72,3	R\$ 32,66	R\$ 2.359,87
				SUB-TOTAL ITEM 04:	R\$ 2.359,87
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	232,2	R\$ 2,25	R\$ 522,45
				SUB-TOTAL ITEM 05:	R\$ 522,45

SUB-TOTAL: R\$ 8.686,96

OBJETO DO ORÇAMENTO: Demolição de divisórias e remoção de aparelhos hidráulicos do vestiário para criação de uma nova sala

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 6.429,93	R\$ 64,30
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	m²	5,9	R\$ 12,38	R\$ 73,01
02.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	33,3	R\$ 14,98	R\$ 498,97
02.03	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	3,5	R\$ 93,33	R\$ 327,25
02.04	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC)	m²	4,2	R\$ 34,88	R\$ 146,48
02.05	REMOÇÃO HIDRÁULICA E UTENSÍLIOS	vb	1,0	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02.06	CAÇAMBA	vb	1,0	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	REVESTIMENTOS				
03.01	REBOCO	m²	34,3	R\$ 28,98	R\$ 993,03
04	ESQUADRIAS				
04.01	BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M	und	1,0	R\$ 578,34	R\$ 578,34
05	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				

05.01	PISO CERAMICO PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m ²	21,1	R\$ 73,90	R\$ 1.557,07
05.02	RODAPE DE PEDRA ARDOSIA H= 7 CM	m	19,0	R\$ 16,63	R\$ 316,54
06	PINTURA				
06.01	PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	m ²	75,3	R\$ 14,20	R\$ 1.069,74
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	30,0	R\$ 2,25	R\$ 67,50
SUB-TOTAL:				R\$ 6.494,23	

OBJETO DO ORÇAMENTO: Reforma das duas casinhas de boneca, incluso remoção dos marcos, readequação de vãos das portas e janelas, confecção de novo engradamento e instalação de telhado de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.627,92	R\$ 26,28
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m ²	6,3	R\$ 15,18	R\$ 94,84
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	1,6	R\$ 10,29	R\$ 16,05
03	ALVENARIAS E DIVISÕES				
03.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m ²	1,0	R\$ 44,46	R\$ 44,46
04	REVESTIMENTOS				
04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m ²	1,0	R\$ 9,43	R\$ 9,43
04.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	m ²	1,0	R\$ 34,30	R\$ 34,30
05	PINTURA				
05.01	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	80,0	R\$ 12,00	R\$ 960,00
06	COBERTURAS				
06.01	PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, CAIBRO 6 X 4,0 CM	m	28,0	R\$ 18,71	R\$ 523,95
06.02	COBERTURA EM TELHA DE PVC	m ²	15,1	R\$ 60,61	R\$ 916,76
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	12,5	R\$ 2,25	R\$ 28,13
SUB-TOTAL:				R\$ 2.654,20	
VALOR TOTAL:				R\$ 19.999,98	

(Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Contagem, 31 de outubro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

08 334 857/0001-50
DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Rua Seis, N.º 86
Baixo Morada Nova - CEP 32143-480
CONTAGEM - M3



Ebe
Ebe Aparecida C. Melo
M 2.834.303
Sócia Proprietária
DHD Engenharia

Ebe A. Cunha Melo
Ebe A. Cunha Melo
Sócia - Proprietária
DHD Engenharia

E. M. GLÓRIA MARQUES

Rua do Goiabão, 50 - Bom Jesus, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Refazer contrapiso danificado ao redor da árvore no pátio da educação infantil, assentamento da grade de divisa e portão, reutilizando grades existentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3,0	R\$ 2.287,60	R\$ 68,63
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	30,4	R\$ 14,00	R\$ 425,60
03	GRADES E PORTÕES				
03.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS GRADES E CONFEÇÃO DE 2 PORTÕES UTILIZANDO AS GRADES EXISTENTES	vb	1,0	R\$ 800,00	R\$ 800,00
04	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
04.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	30,4	R\$ 30,00	R\$ 912,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 5,00	R\$ 150,00
SUB-TOTAL:					R\$ 2.356,23

OBJETO DO ORÇAMENTO: Contra piso frontal a sala multimídia e mão de obra para assentamento do piso intertravado que será recebido da doação da UMEI Bernardo Monteiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3,0	R\$ 9.444,35	R\$ 283,33
SUB-TOTAL ITEM 01:					R\$ 283,33
03	CONTRAPISO DESEMPENADO FRONTAL A SALA MULTIMÍDIA				
03.01	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	m²	159,9	R\$ 6,00	R\$ 959,10
03.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	159,9	R\$ 30,00	R\$ 4.795,50
SUB-TOTAL ITEM 03:					R\$ 5.754,60
04	SERVIÇOS AUXILIARES				
04.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	m²	72,3	R\$ 35,00	R\$ 2.528,75
SUB-TOTAL ITEM 04:					R\$ 2.528,75
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	232,2	R\$ 5,00	R\$ 1.161,00
SUB-TOTAL ITEM 05:					R\$ 1.161,00
SUB-TOTAL:					R\$ 9.727,68

OBJETO DO ORÇAMENTO: Demolição de divisórias e remoção de aparelhos hidráulicos do vestiário para criação de uma nova sala

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3,0	R\$ 7.387,46	R\$ 221,62
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	m²	5,9	R\$ 10,00	R\$ 59,00
02.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	33,3	R\$ 15,00	R\$ 499,80
02.03	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	3,5	R\$ 79,00	R\$ 278,71
02.04	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC)	m²	4,2	R\$ 36,00	R\$ 151,20
02.05	REMOÇÃO HIDRÁULICA E UTENSÍLIOS	vb	1,0	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02.06	CAÇAMBA	vb	1,0	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	REVESTIMENTOS				
03.01	REBOCO	m²	34,3	R\$ 38,00	R\$ 1.302,34
04	ESQUADRIAS				
04.01	BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M	und	1,0	R\$ 550,00	R\$ 550,00
05	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
05.01	PISO CERAMICO PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	21,1	R\$ 80,00	R\$ 1.685,60

Rua Dezesesseis nº 95 – Bairro Milanez
Contagem/MG CEP: 32.143-170
Tel: (31) 99168 2943



05.02	RODAPE DE PEDRA ARDOSIA H= 7 CM	m	19,0	R\$ 20,00	R\$ 380,80
06	PINTURA				
06.01	PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	m²	75,3	R\$ 15,00	R\$ 1.130,01
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 5,00	R\$ 150,00
SUB-TOTAL:					R\$ 7.609,08

OBJETO DO ORÇAMENTO: Reforma das duas casinhas de boneca, incluso remoção dos marcos, readequação de vãos das portas e janelas, confecção de novo engradamento e instalação de telhado de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3,0	R\$ 3.207,48	R\$ 96,22
02	DEMOLICOES E REMOÇOES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m²	6,3	R\$ 15,18	R\$ 94,84
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	1,6	R\$ 10,29	R\$ 16,05
03	ALVENARIAS E DIVISÕES				
03.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m²	1,0	R\$ 44,46	R\$ 44,46
04	REVESTIMENTOS				
04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m²	1,0	R\$ 8,00	R\$ 8,00
04.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	m²	1,0	R\$ 38,00	R\$ 38,00
05	PINTURA				
05.01	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	80,0	R\$ 15,00	R\$ 1.200,00
06	COBERTURAS				
06.01	PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, CAIBRO 6 X 4,0 CM	m	28,0	R\$ 25,00	R\$ 700,00
06.02	COBERTURA EM TELHA DE PVC	m²	15,1	R\$ 69,00	R\$ 1.043,63
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	12,5	R\$ 5,00	R\$ 62,50
SUB-TOTAL:					R\$ 3.303,70
VALOR TOTAL:					R\$ 22.996,69

Contagem, 01 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação



Hugo Ramos

Acert Construções e Serviços Ltda



Rua Dezesesseis nº 95 – Bairro Milanez
Contagem/MG CEP: 32.143-170
Tel: (31) 99168 2943



E. M. GLÓRIA MARQUES
Rua do Goiabão, 50 - Bom Jesus, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Refazer contrapiso danificado ao redor da árvore no pátio da educação infantil, assentamento da grade de divisa e portão, reutilizando grades existentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 2.230,20	R\$ 111,51
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	30,4	R\$ 13,00	R\$ 395,20
03	GRADES E PORTÕES				
03.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS GRADES E CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES UTILIZANDO AS GRADES EXISTENTES	vb	1,0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
04.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	30,4	R\$ 25,00	R\$ 760,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 2,50	R\$ 75,00

SUB-TOTAL: R\$ 2.341,71

OBJETO DO ORÇAMENTO: Contra piso frontal a sala multimídia e mão de obra para assentamento do piso intertravado que será recebido da doação da UMEI Bernardo Monteiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 7.947,12	R\$ 397,36
SUB-TOTAL ITEM 01:					R\$ 397,36
03	CONTRAPISO DESEMPENADO FRONTAL A SALA MULTIMÍDIA				
03.01	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	m²	159,9	R\$ 7,53	R\$ 1.202,87
03.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	159,9	R\$ 25,00	R\$ 3.996,25
SUB-TOTAL ITEM 03:					R\$ 5.199,12
04	SERVÍCIOS AUXILIARES				
04.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	m²	72,3	R\$ 30,00	R\$ 2.167,50
SUB-TOTAL ITEM 04:					R\$ 2.167,50
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	232,2	R\$ 2,50	R\$ 580,50
SUB-TOTAL ITEM 05:					R\$ 580,50

SUB-TOTAL: R\$ 8.344,48

OBJETO DO ORÇAMENTO: Demolição de divisórias e remoção de aparelhos hidráulicos do vestiário para criação de uma nova sala

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 6.593,89	R\$ 329,69
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	m²	5,9	R\$ 13,00	R\$ 76,70
02.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	33,3	R\$ 15,00	R\$ 499,80
02.03	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	3,5	R\$ 94,00	R\$ 331,63
02.04	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC)	m²	4,2	R\$ 35,00	R\$ 147,00
02.05	REMOÇÃO HIDRÁULICA E UTENSÍLIOS	vb	1,0	R\$ 600,00	R\$ 600,00
02.06	ÇAÇAMBA	vb	1,0	R\$ 350,00	R\$ 350,00
03	REVESTIMENTOS				
03.01	REBOCO	m²	34,3	R\$ 28,98	R\$ 993,03
04	ESQUÁDRAS				
04.01	BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M	und	1,0	R\$ 550,00	R\$ 550,00
05	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
05.01	PISO CERAMICO PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	21,1	R\$ 72,00	R\$ 1.517,04
05.02	RODAPE DE PEDRA ARDOSIA H= 7 CM	m	19,0	R\$ 17,00	R\$ 323,68
06	PINTURA				

06.01	PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	m ²	75,3	R\$ 15,00	R\$ 1.130,01
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	30,0	R\$ 2,50	R\$ 75,00

SUB-TOTAL: R\$ 6.923,59

OBJETO DO ORÇAMENTO: Reforma das duas casinhas de boneca, incluso remoção dos marcos, readequação de vãos das portas e janelas, confecção de novo engradamento e instalação de telhado de PVC.


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 3.092,23	R\$ 154,61
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m ²	6,3	R\$ 14,00	R\$ 87,50
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	1,6	R\$ 10,00	R\$ 15,60
03	ALVENARIAS E DIVISÕES				
03.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m ²	1,0	R\$ 42,00	R\$ 42,00
04	REVESTIMENTOS				
04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m ²	1,0	R\$ 9,50	R\$ 9,50
04.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	m ²	1,0	R\$ 36,00	R\$ 36,00
05	PINTURA				
05.01	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	80,0	R\$ 14,00	R\$ 1.120,00
06	COBERTURAS				
06.01	PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, CAIBRO 6 X 4,0 CM	m	28,0	R\$ 22,00	R\$ 616,00
06.02	COBERTURA EM TELHA DE PVC	m ²	15,1	R\$ 75,00	R\$ 1.134,38
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	12,5	R\$ 2,50	R\$ 31,25

SUB-TOTAL: R\$ 3.246,84

VALOR TOTAL: R\$ 20.856,61

Contagem, 31 de outubro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

27.022.552/0001-571
M & C ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Seis, nº 96
B. Morada Nova - CEP 32143-480
CONTAGEM - MINAS GERAIS


Douglas da Cunha Melo
M 2.834.303
Sócio Proprietário
M&C Engenharia



E. M. GLÓRIA MARQUES

Rua do Goiabão, 50 - Bom Jesus, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Refazer contrapiso danificado ao redor da árvore no pátio da educação infantil, assentamento da grade de divisa e portão, reutilizando grades existentes.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.143,16	R\$ 21,43
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	30,4	R\$ 13,71	R\$ 416,86
03	GRADES E PORTÕES				
03.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS GRADES E CONFEÇÃO DE 2 PORTÕES UTILIZANDO AS GRADES EXISTENTES	vb	1,0	R\$ 800,00	R\$ 800,00
04	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITÓRIS				
04.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m ²	30,4	R\$ 28,25	R\$ 858,80
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	30,0	R\$ 2,25	R\$ 67,50
SUB-TOTAL:					R\$ 2.164,59

OBJETO DO ORÇAMENTO: Contra piso frontal a sala multimídia e mão de obra para assentamento do piso intertravado que será recebido da doação da UMEI Bernardo Monteiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 8.600,95	R\$ 86,01
SUB-TOTAL ITEM 01:					R\$ 86,01
03	CONTRAPISO DESEMPENADO FRONTAL A SALA MULTIMÍDIA				
03.01	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	m ²	159,9	R\$ 7,53	R\$ 1.202,87
03.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m ²	159,9	R\$ 28,25	R\$ 4.515,76
SUB-TOTAL ITEM 03:					R\$ 5.718,63
04	SERVIÇOS AUXILIARES				
04.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	m ²	72,3	R\$ 32,66	R\$ 2.359,87
SUB-TOTAL ITEM 04:					R\$ 2.359,87
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	232,2	R\$ 2,25	R\$ 522,45
SUB-TOTAL ITEM 05:					R\$ 522,45
SUB-TOTAL:					R\$ 8.686,96

OBJETO DO ORÇAMENTO: Demolição de divisórias e remoção de aparelhos hidráulicos do vestiário para criação de uma nova sala

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 7.070,71	R\$ 70,71
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	m ²	5,9	R\$ 12,56	R\$ 74,10
02.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m ²	33,3	R\$ 17,06	R\$ 568,52
02.03	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m ³	3,5	R\$ 122,79	R\$ 433,19
02.04	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, MARMORITE, ETC)	m ²	4,2	R\$ 40,70	R\$ 170,94
02.05	REMOÇÃO HIDRÁULICA E UTENSÍLIOS	vb	1,0	R\$ 569,23	R\$ 569,23
02.06	CACAMBA	vb	1,0	R\$ 301,69	R\$ 301,69
03	REVESTIMENTOS				
03.01	REBOCO	m ²	34,3	R\$ 30,23	R\$ 1.035,87
04	ESQUADRIAS				
04.01	BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M	und	1,0	R\$ 578,34	R\$ 578,34
05	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITÓRIS				
05.01	PISO CERAMICO PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m ²	21,1	R\$ 85,31	R\$ 1.797,48
05.02	RODAPE DE PEDRA ARDOSIA H= 7 CM	m	19,0	R\$ 16,63	R\$ 316,54
06	PINTURA				
06.01	PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	m ²	75,3	R\$ 14,98	R\$ 1.128,50


07 LIMPEZA GERAL					
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	30,0	R\$ 3,21	R\$ 96,30
SUB-TOTAL:					R\$ 7.141,42

OBJETO DO ORÇAMENTO: Reforma das duas casinhas de boneca, incluso remoção dos marcos, readequação de vãos das portas e janelas, confecção de novo engradamento e instalação de telhado de PVC.


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.922,83	R\$ 29,23
02	DEMOLICOES E REMOÇOES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m ²	6,3	R\$ 19,56	R\$ 122,27
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	1,6	R\$ 12,65	R\$ 19,73
03	ALVENARIAS E DIVISÕES				
03.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m ²	1,0	R\$ 50,00	R\$ 50,00
04	REVESTIMENTOS				
04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m ²	1,0	R\$ 12,81	R\$ 12,81
04.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	m ²	1,0	R\$ 39,00	R\$ 39,00
05	PINTURA				
05.01	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	80,0	R\$ 13,85	R\$ 1.108,00
06	COBERTURAS				
06.01	PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, CAIBRO 6 X 4,0 CM	m	28,0	R\$ 18,71	R\$ 523,95
06.02	COBERTURA EM TELHA DE PVC	m ²	15,1	R\$ 66,58	R\$ 1.006,95
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	12,5	R\$ 3,21	R\$ 40,13

SUB-TOTAL: R\$ 2.952,06

VALOR TOTAL: R\$ 20.945,03

(Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Contagem, 01 de Novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

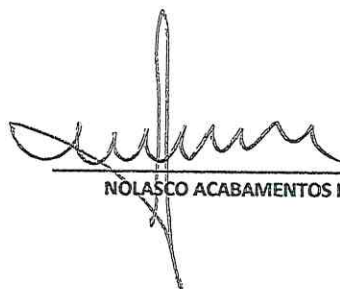

 NOLASCO ACABAMENTOS LTDA





E. M. GLÓRIA MARQUES

Rua da Goiabão, 50 - Bom Jesus, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Refazer contrapiso danificado ao redor da árvore no pátio da educação infantil, assentamento da grade de divisa e portão, reutilizando grades existentes.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.254,92	R\$ 22,55
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	30,4	R\$ 16,21	R\$ 492,86
03	GRADES E PORTÕES				
03.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS GRADES E CONFECÇÃO DE 2 PORTÕES UTILIZANDO AS GRADES EXISTENTES	vb	1,0	R\$ 798,98	R\$ 798,98
04	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
04.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	30,4	R\$ 29,45	R\$ 895,28
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 2,26	R\$ 67,80

SUB-TOTAL: R\$ 2.277,47

OBJETO DO ORÇAMENTO: Contra piso frontal a sala multimídia e mão de obra para assentamento do piso intertravado que será recebido da doação da UMEI Bernardo Monteiro.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 10.184,68	R\$ 101,85
SUB-TOTAL ITEM 01:					R\$ 101,85
03	CONTRAPISO DESEMPENADO FRONTAL A SALA MULTIMÍDIA				
03.01	APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	m²	159,9	R\$ 8,23	R\$ 1.314,77
03.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,0 CM	m²	159,9	R\$ 35,70	R\$ 5.706,65
SUB-TOTAL ITEM 03:					R\$ 7.021,41
04	SERVIÇOS AUXILIARES				
04.01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PISO COM BLOCOS INTERTRAVADOS, INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA	m²	72,3	R\$ 31,54	R\$ 2.278,58
SUB-TOTAL ITEM 04:					R\$ 2.278,58
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	232,2	R\$ 3,81	R\$ 884,68
SUB-TOTAL ITEM 05:					R\$ 884,68

SUB-TOTAL: R\$ 10.286,52

OBJETO DO ORÇAMENTO: Demolição de divisórias e remoção de aparelhos hidráulicos do vestiário para criação de uma nova sala

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 7.177,63	R\$ 71,78
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR	m²	5,9	R\$ 18,20	R\$ 107,38
02.02	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	33,3	R\$ 21,23	R\$ 707,22
02.03	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	3,5	R\$ 93,56	R\$ 330,09
02.04	REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC)	m²	4,2	R\$ 56,24	R\$ 236,20
02.05	REMOÇÃO HIDRÁULICA E UTENSÍLIOS	vb	1,0	R\$ 551,68	R\$ 551,68
02.06	CAÇAMBA	vb	1,0	R\$ 298,69	R\$ 298,69
03	REVESTIMENTOS				
03.01	REBOCO	m²	34,3	R\$ 31,25	R\$ 1.071,00
04	ESQUADRIAS				
04.01	BASCULANTE DE FERRO 1x1/8" - 2,00x0,50M	und	1,0	R\$ 645,29	R\$ 645,29
05	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
05.01	PISO CERAMICO PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	21,1	R\$ 73,90	R\$ 1.557,07
05.02	RODAPE DE PEDRA ARDOSIA H= 7 CM	m	19,0	R\$ 17,76	R\$ 338,20
06	PINTURA				
06.01	PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	m²	75,3	R\$ 16,52	R\$ 1.244,52
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	30,0	R\$ 3,01	R\$ 90,30

SUB-TOTAL: R\$ 7.249,41

CNPJ n.º 15.428.049/0001-17

Endereço: Rua Cardeal Arco Verde, 1.420 - Água Branca - Contagem/MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Reforma das duas casinhas de boneca, incluso remoção dos marcos, readequação de vãos das portas e janelas, confecção de novo engradamento e instalação de telhado de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,0	R\$ 2.594,07	R\$ 25,94
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	m ²	6,3	R\$ 20,65	R\$ 129,06
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	1,6	R\$ 13,06	R\$ 20,38
03	ALVENARIAS E DIVISÕES				
03.01	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR	m ²	1,0	R\$ 44,98	R\$ 44,98
04	REVESTIMENTOS				
04.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA	m ²	1,0	R\$ 10,00	R\$ 10,00
04.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	m ²	1,0	R\$ 40,81	R\$ 40,81
05	PINTURA				
05.01	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m ²	80,0	R\$ 11,00	R\$ 880,00
06	COBERTURAS				
06.01	PEÇAS PARA ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU, CAIBRO 6 X 4,0 CM	m	28,0	R\$ 18,71	R\$ 523,95
06.02	COBERTURA EM TELHA DE PVC	m ²	15,1	R\$ 60,61	R\$ 916,76
07	LIMPEZA GERAL				
07.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	12,5	R\$ 2,25	R\$ 28,13

SUB-TOTAL: R\$ 2.620,01

VALOR TOTAL: R\$ 22.433,41

(Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Contagem, 31 de outubro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação


RODALU ACABAMENTOS LTDA





**Secretaria Municipal
de Educação**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 045/2018 - CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 045/2018, NO VALOR DE 19.999,98 PARA ADAPTAÇÕES NA ESCOLA PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INFANTIL.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.

ASSINADO: 04/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO N.º 087/2018 - CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE FORMA A CONTRIBUIR SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA E DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ÁPIO CARDOSO.

VALOR DE R\$ 44.692,45 , EM 1 PARCELA DE CUSTEIO E UMA DE CAPITAL

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101 E 1.12.1.12.361.0029.2081- 44504100 FONTE: 0101

SINADO: 30/11/2018 VIGÊNCIA: 31/12/2018

Secretaria Municipal de Educação

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações designada pela Portaria 034 de 24 de Setembro de 2018, torna público que está SUSPENDENDO SINE DIE a Carta Convite número 001/2018, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, PARA REFORMA DOS TELHADOS DAS SALAS 23, 27 e 28, INCLUINDO TROCA PARCIAL DO ENGRADAMENTO, TROCA TOTAL DO FORRO DE PVC E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizada à Rua Uruguai, nº 259, Bairro Industrial, Contagem-MG. Maiores informações pelo telefone (31) 3356-7001/3352-5410/3391-9014.

**Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável****PROCESSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social
(Rito da RESOLUÇÃO No 412, DE 13 DE MAIO DE 2009)

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD torna público que tramita perante o Órgão Ambiental, requerimento de Licença Ambiental Concomitante (LP+LI+LO), Processo n.º 21787/2018-03A e n.º 21788/2018-03A, (Processo de Terraplanagem, Drenagem e Movimentação de Terra n.º 21784/2018-03A n.º 21786/2018-03A) para implantação do empreendimento “Residencial Multifamiliar Icaivera I e II do Programa Minha Casa Minha Vida – 600 unidades”, de responsabilidade de CONATA ENGENHARIA LTDA. Localização: Terreno denominado “DONATO” - Via de Acesso Icaivera s/nº - Bairro Icaivera – Contagem-MG, Área: 70.357,155m² (Matrícula 102.511 Livro n.º 2 pág 1. Responsável Técnico: Erik Phillip Costa Mendonça CREA-MG 173.199 – UMA Gestão de Projetos Ltda.

Contagem, 04 de Dezembro de 2018.

MARCOS ANTONIO BOTELHO NIEMANN

Assessor Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos.



Caixa Escolar Eduarda Pereira	R\$ 13.000,00
Caixa Escolar Padre Joaquim de Souza Silva	R\$ 20.000,00
Caixa Escolar Cândida Rosa do Espirito Santo	R\$ 12.996,49
Caixa Escolar José Lucas Filho	R\$ 32.999,90
Caixa Escolar Sônia Braga da Cruz Ribeiro	R\$ 11.984,80
Caixa Escolar UMEI Mira Pereira – 1º Ad. Pq. São João	R\$ 2.000,00
Caixa Escolar UMEI Bom Jesu	R\$ 29.942,05
Caixa Escolar UMEI Darcy Ribeiro	R\$ 2.999,67
Caixa Escolar Ver. José Ferreira de Aguiar	R\$ 14.999,68
Caixa Escolar Francisco Borges	R\$ 27.999,59
Caixa Escolar Ápio Cardoso	R\$ 44.692,45
Caixa Escolar UMEI Conj. Água Branca	R\$ 25.999,98
Caixa Escolar UMEI Mira Pereira – 2º AD.	R\$ 7.942,00
Caixa Escolar Glória Marques Diniz	R\$ 19.999,98
Caixa Escolar Domingos Diniz Moreira	R\$ 32.999,65
Caixa Escolar Rita Carmelinda Rocha	R\$ 14.895,03
Dotação orçamentária: 1121.12.361.0029.2081 – 33504100 – Fonte 0101 – Reduzida 637	

Justificamos que é de caráter de urgência e inadiável, por se tratar de repasse de recursos financeiros aos Caixas Escolares para reformas emergências.

Nome da servidora que realizará a emissão do empenho:

Maria Lúcia Costa Mota

Matricula: 16781-9

Desse modo, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e renovamos nossos elevados protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação

